ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání
1		Omezení průchodu veřejnosti přes výpravní budovu	
2		Výluka Česká pošta	65 dny
3		**Opava západ ON – revitalizace**	**701 dny**
4		Předání pracoviště	1 den
5		Vyklizení objektu	15 dny
6		Zařízení staveniště	10 dny
7		**Stavební práce - část policice, bývalé celnice**	**540 dny**
8		Bourací práce	90 dny
9		Demontáže zařizovacích předmětů, starých sítí	30 dny
10		Svislé a vodorovné konstrukce	290 dny
11		SDK a ostatní vnitřní kce	120 dny
12		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	130 dny
13		Rekonstrukce střechy nástupiště	90 dny
14		Fasáda objektu	90 dny
15		TZB a elektro	130 dny
16		Ostatní práce a dokončovací práce	90 dny
17		Orientační systém a mobiliář	45 dny
18		**Stavební práce - Česká pošta**	**65 dny**
19		Bourací práce	15 dny
20		Demontáže zařizovacích předmětů, starých sítí	10 dny
21		Svislé a vodorovné konstrukce	20 dny
22		SDK a ostatní vnitřní kce	15 dny
23		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	15 dny
24		TZB a elektro	25 dny
25		Ostatní práce a dokončovací práce	5 dny
26		SO 03 + SO 04 Nové inženýrské sítě	50 dny
27		SO 02 Přeložka VO	15 dny
28		Dokončovací práce, Stěhovací práce	20 dny
29		Posouzení interoperability	102 dny
30		Předání díla	14 dny
31		Dokončení díla	0 dny

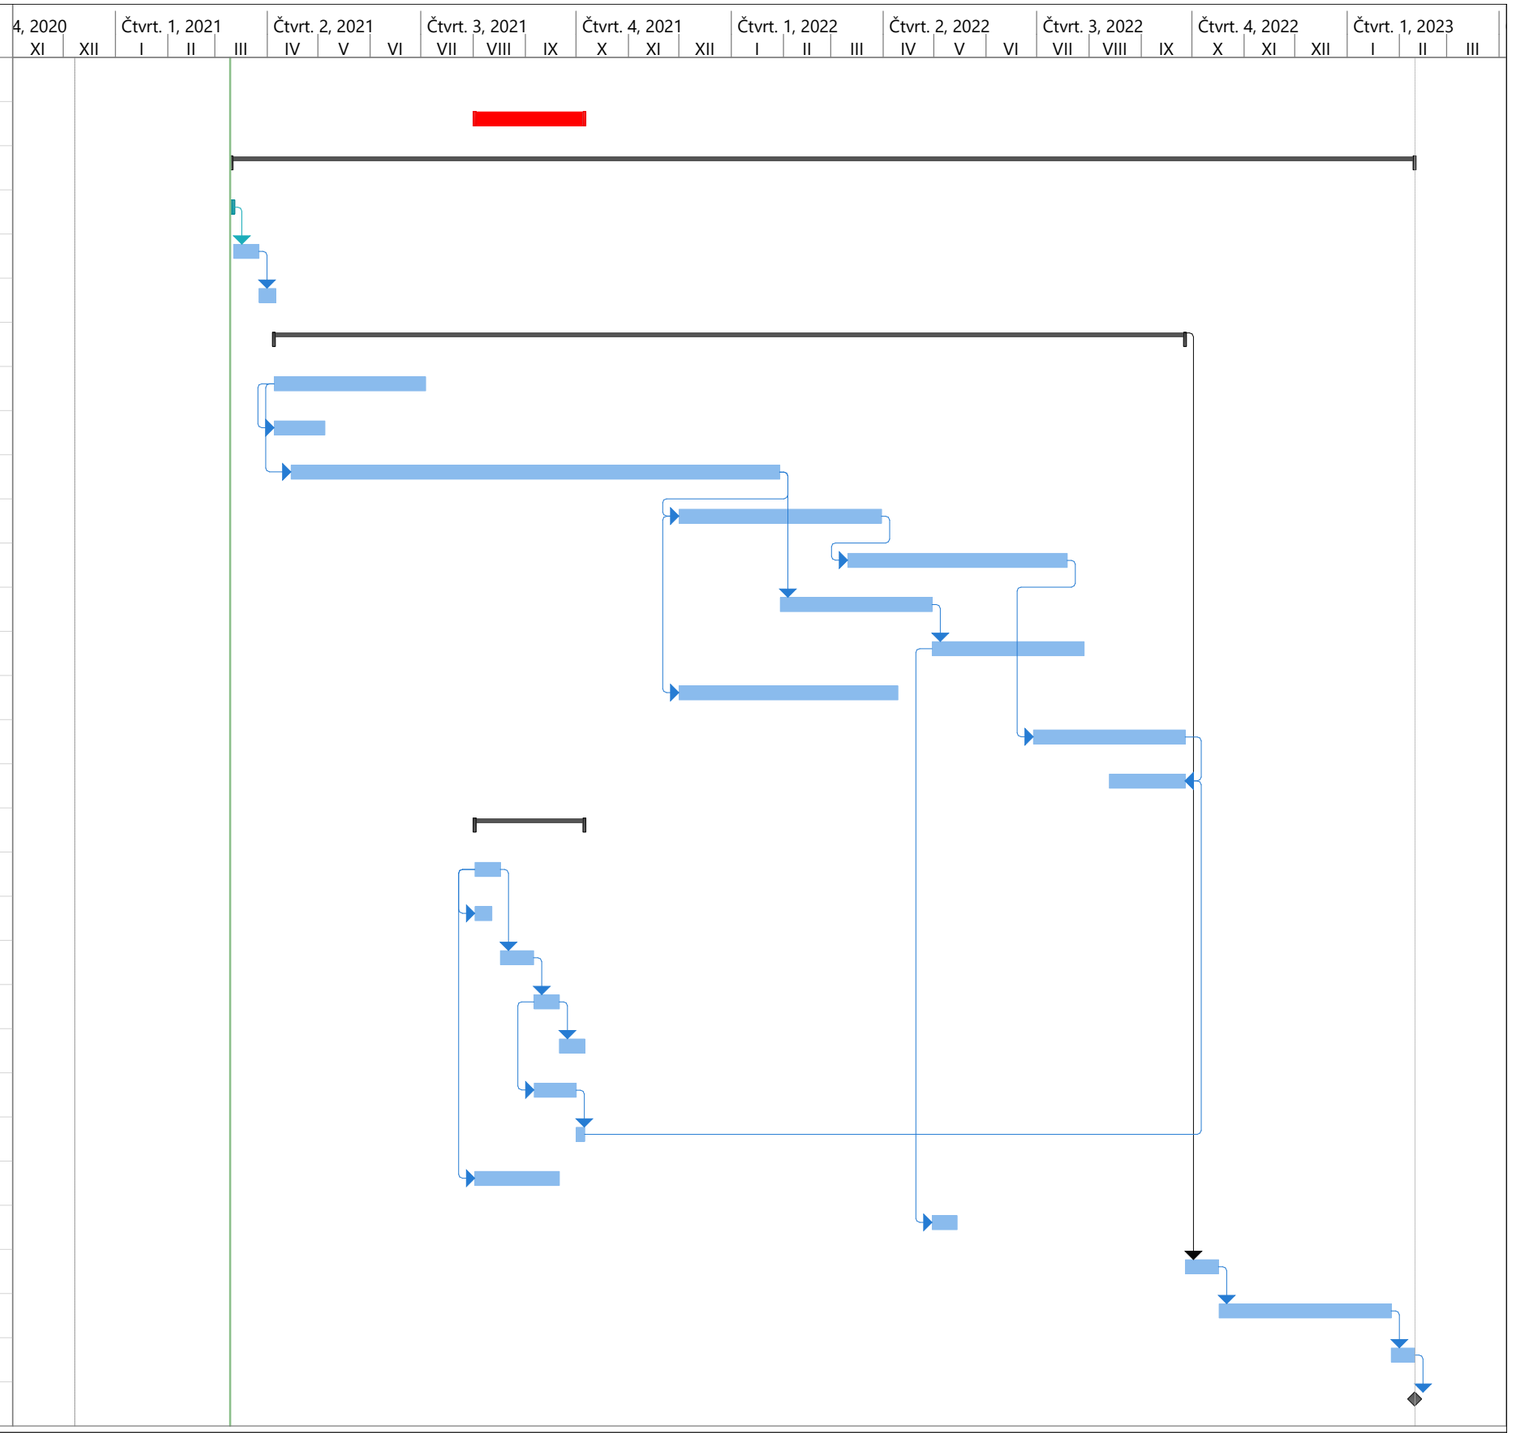

Projekt: Opava západ.mpp
Datum: 10.03. 21

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	
