



Smlouva o spolupráci

za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“

uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava
zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města Opavy
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, č.ú.: 27-1842619349/0800
(dále jen „Město Opava“)

a

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná Mgr. Bc. Soňa Křítková, Ph.D., pověřena řízením
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-0494050277/0100
(dále jen „ŘSD ČR“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o spolupráci

(dále jen „Smlouva“)

jejímž cílem je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při realizaci stavby „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“, a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace.

I.

Preambule

1. Stavba představuje vybudování nové silnice „I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“, která navazuje na úseky „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – východní část“ a na „Propojení silnice I/11 a I/56, Spojka S1 v Opavě“, a tím kompletuje celou stavbu obchvatu I/11 včetně napojení na silnici I/57.
2. Stavba zahrnuje:
 - a) objekty realizované ŘSD ČR z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), či z jiných zdrojů např. Operační program Doprava (OPD)
 - b) objekty realizované Městem Opava z prostředků Města Opavy.
3. Uvedené části stavby je účelné realizovat jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována na základě dohody všech zúčastněných stran s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví hradit a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově.

4. Účelem smlouvy je proto koordinace činností obou účastníků při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
5. Náklady na stavební objekty dle předpokladu dle Dokumentace pro územní řízení z roku 2013 činí celkem 1 593 124 092,- Kč vč. 10% rezervy a vč. DPH (slovy: jednamiliardapětsetdevadesáttřimilionyjednostodvacetčtyřítisícdevadesátdvě koruny české vč. 10% rezervy a vč. DPH) z toho 1 570 666 562,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetdesátmilionůšestsetšedesátšesttisícpětsetšedesátdvě koruny české) je podíl nákladů připadající na stavební objekty ŘSD ČR a 22 457 530,- Kč (slovy: dvacetdvamilionyčtyřístapadesátsedmtisícpětsetšestřicet korun českých) je podíl nákladů připadající na stavební objekty Města Opavy. Procentuální podíl nákladů na stavební objekty je tedy 98,59 % pro ŘSD ČR a 1,41 % pro Město Opavu.
6. Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem této smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

II.

Záměr Města

Město prohlašuje, že je v jeho zájmu co nejrychleji realizovat a uvést do provozu stavbu „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“, přičemž v jeho výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „stavební objekty v zájmu Města Opavy“). Město Opava se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu Města.

III.

Záměr ŘSD ČR

ŘSD ČR prohlašuje, že je v jeho zájmu co nejrychleji připravit, realizovat a uvést do provozu stavbu „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“, přičemž v jeho výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 2 (dále jen „stavební objekty v zájmu ŘSD ČR“). ŘSD ČR se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR.

IV.

Závazky smluvních stran

Z důvodů výše uvedených a k jejich dosažení došlo mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě o vymezení vzájemných povinností a závazků plynoucích z této smlouvy s tím, že:

1. ŘSD ČR se zavazuje:

- a) Zajistit finanční prostředky ze SFDI či jiných zdrojů v předpokládané výši 1 570 666 562,- Kč (včetně DPH) tak, aby stavba byla realizována v letech 2018 až 2021.
- b) Zajistit potřebná povolení pro přípravu a realizaci stavby.
- c) Zajistit a provést výběr zhotovitele celé stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle vnitřních normativních aktů ŘSD ČR.
- d) Rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby oznámit jak vybranému zhotoviteli, tak ostatním uchazečům.

- e) Uzavřít spolu s Městem Opava smlouvu o dílo se zhotovitelem celé stavby. Podmínky uzavření tohoto smluvního závazku s finančním podílem obou smluvních stran budou mezi ŘSD ČR a Městem Opava předem projednány, do smluvních závazků budou ŘSD ČR a Město Opava vstupovat s právy a povinnostmi objednatelů.
- f) Zajistit výkon funkce hlavního inženýra stavby spočívající v koordinaci stavebních prací pro oba objednatele stavby a zajistit výkon stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů jak ŘSD ČR, tak i Města Opava, dále zajistit funkci koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR, zajistit archeologický dohled stavby a další nezbytně nutné činnosti související se zajištěním přípravy a realizace záměru.
- g) Zajistit jménem ŘSD ČR z prostředků SFDI či z jiných zdrojů majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR. Rozsah majetkoprávního vypořádání bude stanoven dle geometrických plánů vyhotovených pro jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení a předání vlastníkovi či majetkovému správci. Zajistit svým jménem další majetkoprávní vypořádání objektů v zájmu ŘSD ČR.
- h) Zajistit podklady pro majetkoprávní přípravu a vypořádání stavby, zejména vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů včetně zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

2. Město Opava se zavazuje:

- a) Zajistit finanční prostředky v předpokládané celkové výši 22 457 530,- Kč (včetně DPH) tak, aby stavba byla realizována v letech 2018 -2021.
- b) Uzavřít spolu s ŘSD ČR smlouvu o dílo se zhotovitelem.
- c) Zajistit jménem Města Opavy a z prostředků Města Opavy majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu Města Opavy. Zajistit svým jménem další majetkoprávní vypořádání objektů v zájmu Města Opavy. Spolupracovat s ŘSD ČR při výkupu nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR.
- d) Zprostředkovat pro ŘSD ČR majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
- e) Zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty.
- f) Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby.

V.

Ostatní ujednání

- 1. **Obě smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti:**
 - a) Zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR a v souladu s pravidly poskytovatelů dotace na realizaci stavby (minimálně se bude jednat o povinnou informaci na zadávací dokumentaci, že akce je spolufinancována z dotací příslušného poskytovatele dotace, atd.). Obě smluvní strany se dohodly, že jistota za nabídku bude uchazeči složena na účet ŘSD ČR.
 - b) Uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.

- c) Předání staveniště zhotoviteli stavby.
 - d) Kolaudace stavby nebo jejích samostatně užitelných částí.
 - e) Zajištění povinné publicity plynoucí z požadavků poskytovatelů dotace a příslušných směrnic ŘSD ČR.
 - f) Zajištění archivace veškeré dokumentace týkající se této dotované akce (stavby) na dobu nejméně 10 let po dokončení akce včetně zajištění nezbytné součinnosti při provádění kontrol.
 - g) Zajištění v rámci smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, že tento bude povinen při provádění prací předkládat pravidelně aktualizovaný finanční a technický harmonogram prací.
 - h) Účinná spolupráce při stanovení systému oběhu dokumentace při předávání a fakturaci díla (stavby) v rámci akce mezi objednateli (ŘSD ČR a Město) a zhotovitelem stavby.
 - i) Zajištění vzájemné spolupráce při provádění závěrečného auditu projektu (dotované akce), který jako povinnost vyplývá ze smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatelů dotace či z jiného dotačního titulu.
2. Město je vlastníkem pozemků v katastrálních územích Vávrovice, Jaktař, Palhanec a Kateřinky u Opavy, které se nacházejí v dočasném a trvalém záboru stavby. Město se zavazuje, že k těmto pozemkům v dočasném a trvalém záboru stavby poskytne ŘSD ČR bezúplatně právo provést stavbu.
 3. Pozemky ve vlastnictví Města potřebné pro stavební objekty, jejichž výlučným vlastníkem bude ŘSD ČR, budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. g) této smlouvy.

VI.

Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
2. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, náklady bude uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť a to v souladu s rozdělením podle článku II. a III. této smlouvy.
3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se obě smluvní strany zavazují informovat se navzájem o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
4. Po dokončení stavby zpracují obě strany společné závěrečné vyúčtování stavby.
5. Náklady uváděné v článku I. odst. 5 této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.

VII.

Majetkoprávní vypořádání stavebních objektů a pozemků

1. Smluvní strany se výslovně dohodly na majetkoprávním vypořádání stavebních objektů realizovaných v rámci stavby tak, že:
 - a) Výlučným vlastníkem stavebních objektů v zájmu Města Opavy se stane Město Opava. Toto platí s výjimkou součástí a příslušenství věcí hlavních tak, jak jsou stanoveny v ustanovení § 12 až 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vlastníkem bude vlastník věci hlavní.
 - b) Výlučným vlastníkem stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR bude ŘSD ČR. Toto platí s výjimkou součástí a příslušenství věcí hlavních, tak jak jsou stanoveny v ustanovení § 12 až 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vlastníkem bude vlastník věci hlavní.
2. Smluvní strany se dále zavazují, že nejpozději do jednoho roku po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu mezi sebou zahájí jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků situovaných pod stavbou tak, aby výlučným vlastníkem pozemků pod stavebními objekty ŘSD ČR, byla Česká republika s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR a výlučným vlastníkem pozemků pod stavebními objekty ve vlastnictví Města Opavy bylo Město Opava.

VIII.

Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

1. ŘSD ČR jedná vůči třetím osobám ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat druhého účastníka smlouvy o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
2. Město Opava jedná vůči třetím osobám ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat druhého účastníka o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
3. ŘSD ČR vede celou agendu a korespondenci a bude vykonávat funkci správce akce.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit jednostranně smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas obou účastníků smlouvy.
5. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
6. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této spolupráce.
7. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.
9. Po předání stavebních objektů realizovaných v zájmu Města Opavy do vlastnictví Města Opavy si Město Opava případně reklamace vůči zhotoviteli stavby „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“ v souvislosti s jednotlivými stavebními objekty realizovanými v zájmu Města Opavy bude zajišťovat a uplatňovat samo svým jménem.



IX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
5. Město Opava je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – situace stavby
Příloha č. 2 – seznam stavebních objektů s uvedením nákladů rozdělených dle investorů
8. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 15.09.2014 usnesením č. 557/25 ZM 14 a).

V Opavě dne: 02 -10- 2014

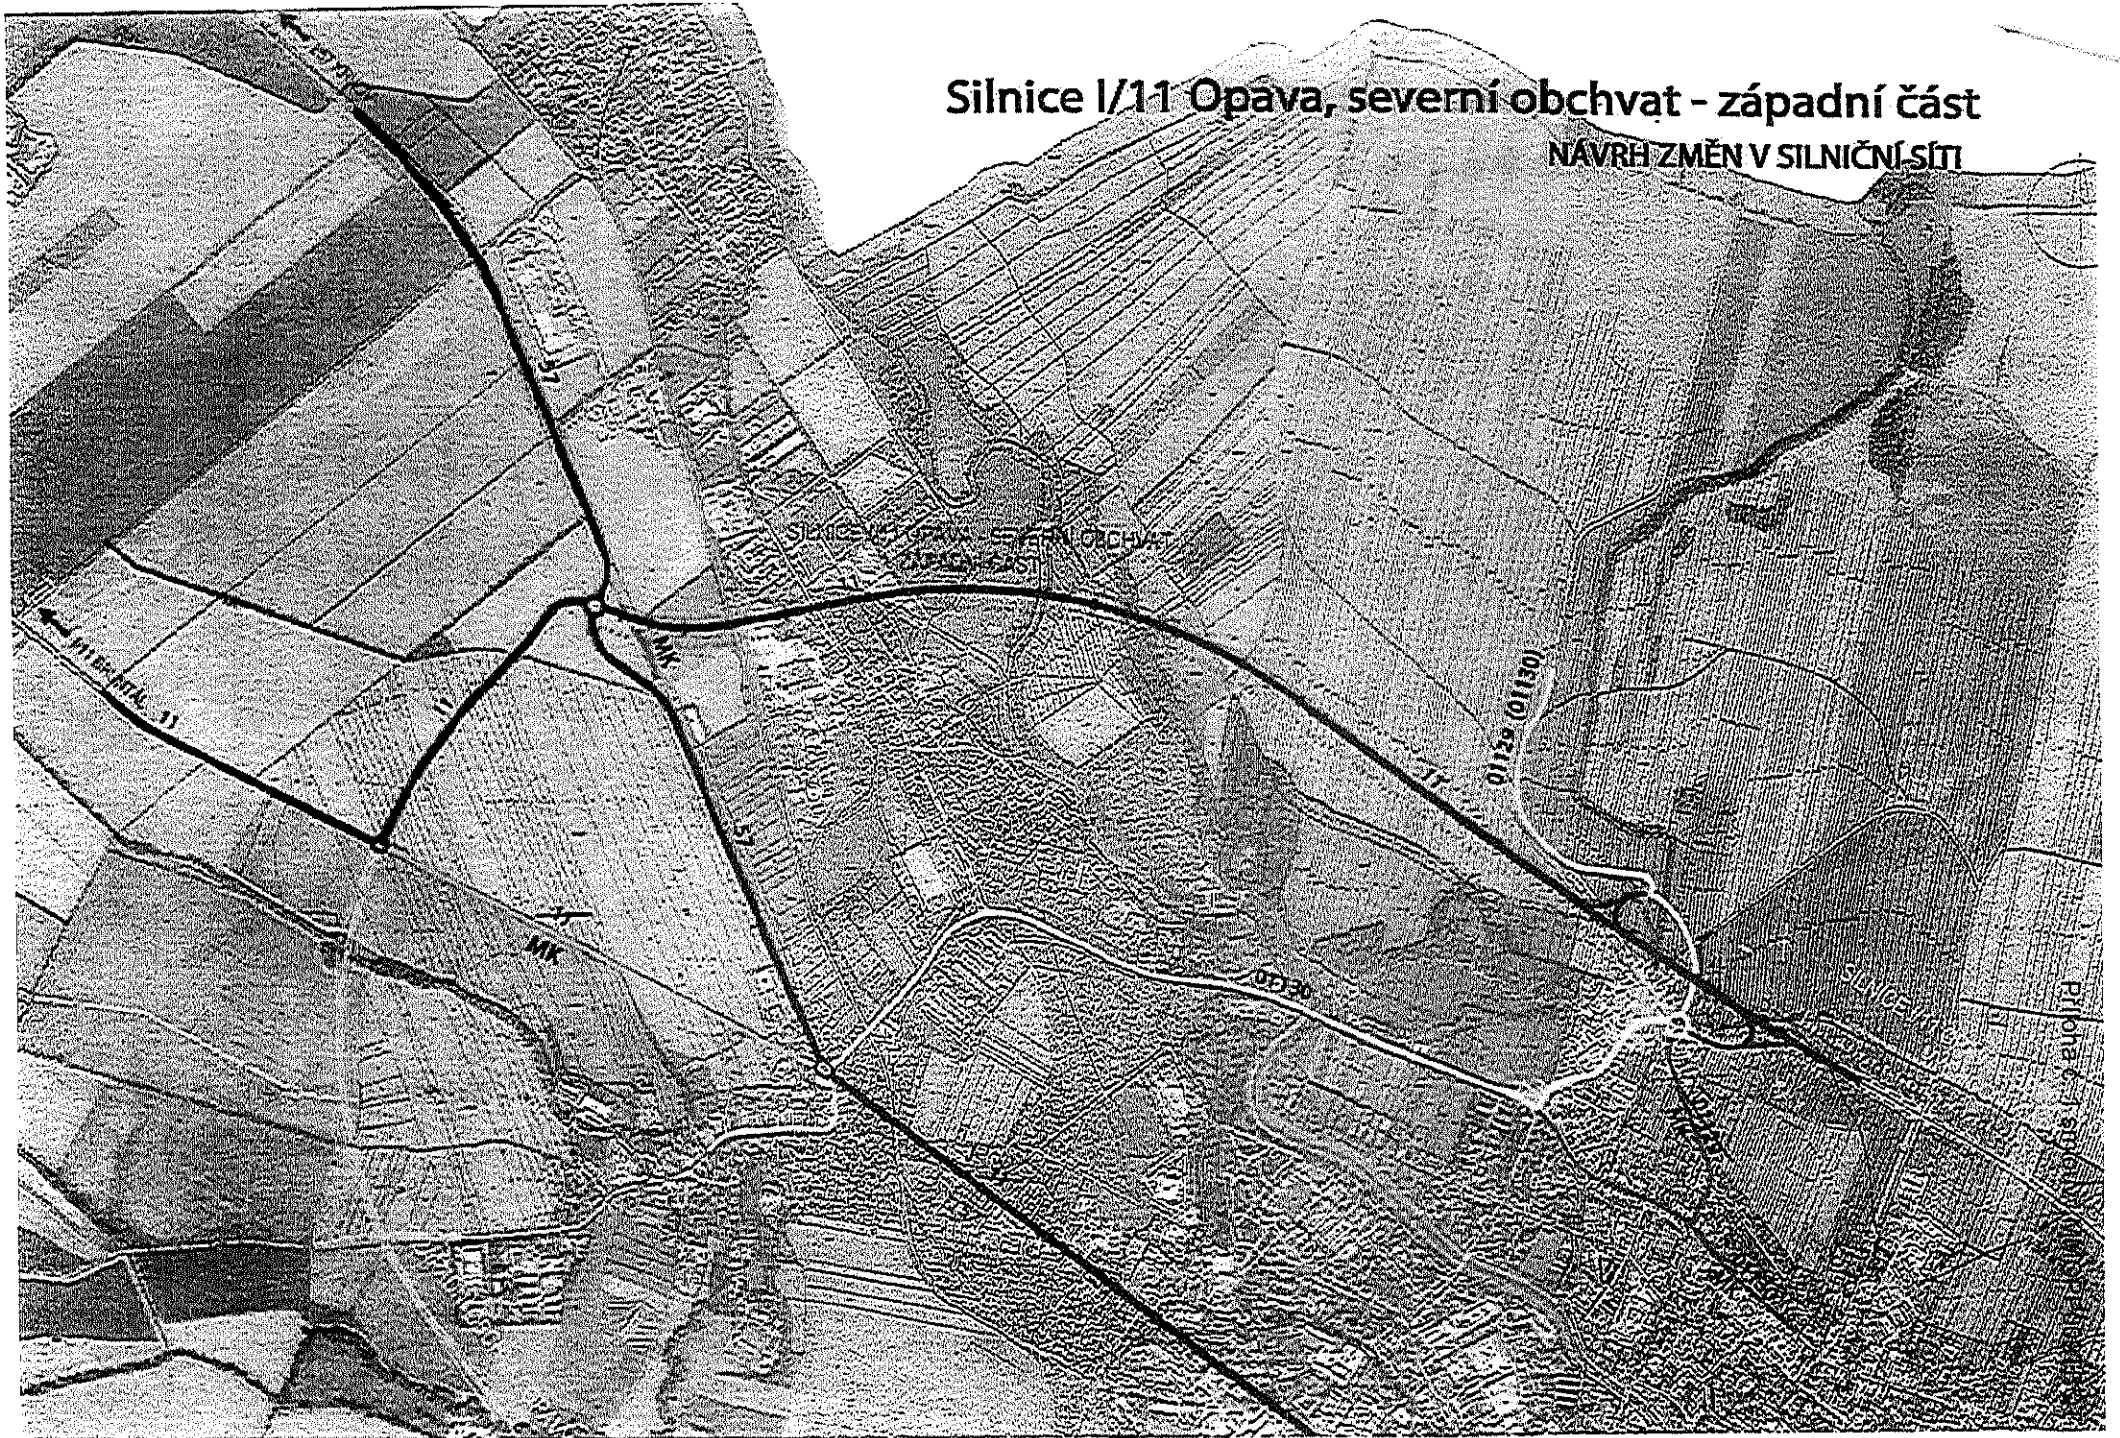
V Praze dne: 13. 11. 2014

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

Ing. Pavla Brady
1.náměstkyně primátora
.....
Za Statutární město Opava
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor
.....
Za ŘSD ČR
Mgr. Bc. Soňa Křítková, Ph.D.
„pověřena řízením“

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část

NÁVRH ZMĚN V SILNIČNÍ SÍTI



VII OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT - ZÁPADNÍ ČÁST, DŮR
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ OBJEKTŮ:

| Č. objektu | Název objektu | Vlastník, Správce | Investor | Cena vylépná celková | | Investor SMO Cena bez DPH |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Cena bez DPH | Investor ASD Cena bez DPH | |
| SO 001 | Příprava území | | | 35 230 700 Kč | 35 230 700 Kč | |
| SO 010 | Děmišce obytného objektu v areálu cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 705 200 Kč | 705 200 Kč | |
| SO 011 | Děmišce skladového objektu v areálu cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 853 125 Kč | 853 125 Kč | |
| SO 021 | Rekultivace sířařelí st. V57 | ASD ČR | ASD ČR | 3 843 000 Kč | 3 843 000 Kč | |
| SO 022 | Rekultivace sířařelí st. II/01129 | MSK, SSMK | ASD ČR | 925 000 Kč | 925 000 Kč | |
| SO 023 | Rekultivace sířařelí MK ul. Obecní | SM Opava | ASD ČR | 60 000 Kč | 60 000 Kč | |
| SO 101 | Síňka V11 - Savení obchvat | ASD ČR | ASD ČR | 275 326 300 Kč | 275 326 300 Kč | |
| SO 102 | Okružní křižovatka na st. V57 | ASD ČR | ASD ČR | 4 628 950 Kč | 4 628 950 Kč | |
| SO 103 | Nápojení sířařelí st. V57 - směr Křmov | ASD ČR | ASD ČR | 6 457 760 Kč | 6 457 760 Kč | |
| SO 104 | Nápojení sířařelí st. V57 - směr Opava | ASD ČR | ASD ČR | 15 655 650 Kč | 15 655 650 Kč | |
| SO 105 | Propojení st. V11 a V57 | ASD ČR | ASD ČR | 39 188 800 Kč | 39 188 800 Kč | |
| SO 106 | Okružní křižovatka na st. V11 | ASD ČR | ASD ČR | 5 342 980 Kč | 5 342 980 Kč | |
| SO 107 | ÚÚK pročištěná Mostní | ASD ČR | ASD ČR | 32 294 260 Kč | 32 294 260 Kč | |
| SO 109 | Úprava křižovatky st. V57 a MK Obecní | ASD ČR | ASD ČR | 2 559 250 Kč | 2 559 250 Kč | |
| SO 109.2 | Úprava křižovatky st. V57 a MK Obecní | ASD ČR | SMO | 1 882 300 Kč | | 1 882 300 Kč |
| SO 111 | Nápojení st. V11 směr Opava | MSK, SSMK | ASD ČR | 277 300 Kč | 277 300 Kč | |
| SO 112 | Přeložka síňky II/01129 | MSK, SSMK | ASD ČR | 32 753 150 Kč | 32 753 150 Kč | |
| SO 121 | Propojení ul. Obecní a Vávrovická | SM Opava | ASD ČR | 7 419 680 Kč | 7 419 680 Kč | |
| SO 122 | Rekonstrukce MK Obecní | SM Opava | SMO | 6 093 600 Kč | | 6 093 600 Kč |
| SO 123 | Rozšíření MK Vávrovická | SM Opava | SMO | 6 734 200 Kč | | 6 734 200 Kč |
| SO 131 | Přeložka účelová komunikace v areálu cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 859 400 Kč | 859 400 Kč | |
| SO 132 | Náhradní zpevněná plocha v areálu cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 4 806 400 Kč | 4 806 400 Kč | |
| SO 151 | Účelová komunikace pro obsluhu území podél propojení st. V11 a V57 vpravo | SM Opava | ASD ČR | 6 416 200 Kč | 6 416 200 Kč | |
| SO 152 | Účelová komunikace pro obsluhu území podél propojení st. V11 a V57 - vlevo | SM Opava | ASD ČR | 1 739 000 Kč | 1 739 000 Kč | |
| SO 163 | Účelová komunikace pro přístup na pozemky podél st. V57 | SM Opava | ASD ČR | 410 600 Kč | 410 600 Kč | |
| SO 155 | Přeložka pojezdové cesty km 2,840 | SM Opava | ASD ČR | 2 020 100 Kč | 2 020 100 Kč | |
| SO 158 | Účelová komunikace pro obsluhu pozemků podél st. V11 - km 2,650 - 4,3 vlevo | SM Opava | ASD ČR | 10 422 000 Kč | 10 422 000 Kč | |
| SO 167 | Přeložka pojezdové cesty km 2,840 - 3,120 vpravo | SM Opava | ASD ČR | 3 783 000 Kč | 3 783 000 Kč | |
| SO 159 | Přeložka pojezdové cesty km 4,440 - 4,520 vpravo | SM Opava | ASD ČR | 659 850 Kč | 659 850 Kč | |
| SO 159 | Přeložka propojení účelových komunikací km 4,100 - 4,690 | SM Opava | ASD ČR | 5 140 900 Kč | 5 140 900 Kč | |
| SO 160 | Účelová komunikace pro obsluhu území - km 4,830 | SM Opava | ASD ČR | 3 646 200 Kč | 3 646 200 Kč | |
| SO 171 | Provozovní komunikace na st. V11 | ASD ČR | ASD ČR | 4 370 000 Kč | 4 370 000 Kč | |
| SO 172 | Provozovní komunikace na st. V57 | ASD ČR | ASD ČR | 3 002 000 Kč | 3 002 000 Kč | |
| SO 201 | Most na st. V11 přes železniční trať | ASD ČR | ASD ČR | 87 435 000 Kč | 87 435 000 Kč | |
| SO 202 | Most na st. V11 přes areál cukrovary a MK Vávrovická | ASD ČR | ASD ČR | 73 416 000 Kč | 73 416 000 Kč | |
| SO 203 | Most na st. V11 přes železniční viadukt a účelovou komunikaci | ASD ČR | ASD ČR | 45 320 000 Kč | 45 320 000 Kč | |
| SO 204 | Estakáda na st. V11 přes Mlýnský náhon, řeku Opavu a pojezdovou cestu | ASD ČR | ASD ČR | 168 939 400 Kč | 168 939 400 Kč | |
| SO 205 | Most na st. V11 přes Píšťský potok a pojezdovou cestu | ASD ČR | ASD ČR | 37 184 000 Kč | 37 184 000 Kč | |
| SO 206 | Most na st. V11 přes II/01129 a pojezdovou cestu | ASD ČR | ASD ČR | 60 952 200 Kč | 60 952 200 Kč | |
| SO 207 | Most na rampě ÚÚK přes účelovou komunikaci | ASD ČR | ASD ČR | 15 658 000 Kč | 15 658 000 Kč | |
| SO 208 | Most na st. II/01129 přes Píšťský potok | MSK, SSMK | ASD ČR | 11 438 000 Kč | 11 438 000 Kč | |
| SO 241 | Základní zdi na st. V11 km 3,190 - 3,470 | ASD ČR | ASD ČR | 6 120 000 Kč | 6 120 000 Kč | |
| SO 261 | Pročištěná síňka na st. V11 km 1,840 - 1,960 | ASD ČR | ASD ČR | 2 007 720 Kč | 2 007 720 Kč | |
| SO 262 | Pročištěná síňka podél propojení ul. Obecní a Vávrovická | SM Opava | ASD ČR | 1 013 200 Kč | 1 013 200 Kč | |
| SO 301.1 | Síňka kahanáze st. V11 - km 1,72 - 1,92 | ASD ČR | ASD ČR | 4 369 650 Kč | 4 369 650 Kč | |
| SO 301.2 | Síňka kahanáze st. V11 - km 2,85 | ASD ČR | ASD ČR | 1 124 700 Kč | 1 124 700 Kč | |
| SO 302.1 | Přeložka spalňkové kahanáze Mondelez CR Biscuit Production u st. V57 | Mondelez CR Biscuit Production | ASD ČR | 1 268 100 Kč | 1 268 100 Kč | |
| SO 302.2 | Úprava dělové kahanáze Mondelez CR Biscuit Production u ul. Obecní | Mondelez CR Biscuit Production | ASD ČR | 172 900 Kč | 172 900 Kč | |
| SO 303 | Síňka kahanáze podél síňky V57 | ASD ČR | ASD ČR | 1 284 650 Kč | 1 284 650 Kč | |
| SO 304.1 | Retenční nádrž u křižovatky st. V11 a V57 | ASD ČR | ASD ČR | 359 600 Kč | 359 600 Kč | |
| SO 304.2 | Retenční nádrž u Píšťského potoka | ASD ČR | ASD ČR | 680 000 Kč | 680 000 Kč | |
| SO 305 | Přeložka pojezdové cesty u křižovatky cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 627 400 Kč | 627 400 Kč | |
| SO 310 | Úpravy koryta vodoteče Píšťský potok | Povodň Oby s.p. | ASD ČR | 1 620 000 Kč | 1 620 000 Kč | |
| SO 311 | Úpravy měřicí podíl st. V11 | vlastníci pozemků | ASD ČR | 5 130 000 Kč | 5 130 000 Kč | |
| SO 312 | Úpravy měřicí podíl propojení st. V11 a V57 | vlastníci pozemků | ASD ČR | 2 850 000 Kč | 2 850 000 Kč | |
| SO 351 | Přeložka vodovodu DI1 160 na ul. Vávrovická | SMV a.s. | SMO | 109 000 Kč | | 109 000 Kč |
| SO 401 | Úprava vzdušného vedení VVI 6. 687 | ČEZ Distribuce a.s. | ASD ČR | 410 000 Kč | 410 000 Kč | |
| SO 411 | Přeložka vzdušného vedení VVI 22 kV - km 1,42 | ČEZ Distribuce a.s. | ASD ČR | 1 145 000 Kč | 1 145 000 Kč | |
| SO 412 | Přeložka kabelu VN - propojení ul. Obecní - Vávrovická | ČEZ Distribuce a.s. | ASD ČR | 130 000 Kč | 130 000 Kč | |
| SO 431 | Přeložka kabelu NN - propojení ul. Obecní - Vávrovická | ČEZ Distribuce a.s. | ASD ČR | 75 000 Kč | 75 000 Kč | |
| SO 432 | Přeložka energetické účelové NN a slaboproudých kabelů cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | |
| SO 433 | Přeložka napájecího kabelu NN v areálu cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 78 000 Kč | 78 000 Kč | |
| SO 451 | Přeložka a doplnění VO na ul. Vávrovická | SM Opava, TSO | SMO | 185 000 Kč | | 185 000 Kč |
| SO 452 | Větrné osvětlení přeložky st. II/01129 | SM Opava, TSO | SMO | 460 000 Kč | | 460 000 Kč |
| SO 461 | Přeložka sdělovacích kabelů podél ul. Vávrovická | Telefonica CR a.s. | ASD ČR | 480 000 Kč | 480 000 Kč | |
| SO 462 | Přeložka vzdušného sdělovacího vedení - ul. Obecní | Telefonica CR a.s. | ASD ČR | 72 000 Kč | 72 000 Kč | |
| SO 463 | Přeložka sdělovacích kabelů Telefonica v areálu cukrovary | Telefonica CR a.s. | ASD ČR | 130 000 Kč | 130 000 Kč | |
| SO 464 | Ochrana sdělovacích kabelů u cukrovary | Telefonica CR a.s. | ASD ČR | 45 000 Kč | 45 000 Kč | |
| SO 481 | Přeložka optických sdělovacích kabelů - propojení Obecní - Vávrovická | Telefonica CR a.s. | ASD ČR | 720 000 Kč | 720 000 Kč | |
| SO 501 | Přeložky VTL plynovodu u okružní křižovatky V11 x V57 | RWE - EMP | ASD ČR | 3 331 125 Kč | 3 331 125 Kč | |
| SO 502 | Přeložka VTL plynovodu km 3,0 - 3,1 | RWE - EMP | ASD ČR | 1 847 760 Kč | 1 847 760 Kč | |
| SO 503 | Přeložky VTL plynovodu km 4,270 - 4,820 | RWE - EMP | ASD ČR | 6 958 425 Kč | 6 958 425 Kč | |
| SO 504 | Úprava VTL plynovodu u křižovatky V57 a ul. Obecní | RWE - EMP | SMO | 1 600 000 Kč | | 1 600 000 Kč |
| SO 601.1 | Přeložka železničního přejezdu č. P7768 v km 108,133 - Železniční svytek | SŽDC | ASD ČR | 618 400 Kč | 618 400 Kč | |
| SO 601.2 | Přeložka železničního přejezdu č. P7768 v km 108,133 - Železniční svytek | SŽDC | ASD ČR | 641 100 Kč | 641 100 Kč | |
| SO 601.3 | Přeložka železničního přejezdu č. P7768 v km 108,133 - Železniční přejezd | SŽDC | ASD ČR | 1 672 600 Kč | 1 672 600 Kč | |
| SO 601.4 | Přeložka železničního přejezdu v km 108,133 - Bezpečovací zařízení | SŽDC | ASD ČR | 950 000 Kč | 950 000 Kč | |
| SO 601.5 | Přeložka železničního přejezdu v km 108,133 - Ochrana sdělovacích kabelů SŽDC | SŽDC | ASD ČR | 25 400 Kč | 25 400 Kč | |
| SO 601.6 | Přeložka železničního přejezdu v km 108,133 - Ochrana sdělovacích kabelů ČD Telematika | ČD Telematika | ASD ČR | 34 200 Kč | 34 200 Kč | |
| SO 701 | Přeložky a úpravy oplocení v areálu cukrovary | Moravskoslezské cukrovary a.s. | ASD ČR | 283 900 Kč | 283 900 Kč | |
| SO 702.1 | Přeložka oplocení areálu Ráčský kovořez a sběrné suroviny | Ráčský kovořez a sběrné suroviny | ASD ČR | 154 220 Kč | 154 220 Kč | |
| SO 702.2 | Přeložka oplocení areálu Ráčský kovořez a sběrné suroviny | Ráčský kovořez a sběrné suroviny | SMO | 238 675 Kč | | 238 675 Kč |
| SO 801 | Vegetační úpravy objektů st. III. úřady | ASD ČR | ASD ČR | 7 205 000 Kč | 7 205 000 Kč | |
| SO 802 | Vegetační úpravy objektů st. III. úřady | MSK, SSMK | ASD ČR | 660 400 Kč | 660 400 Kč | |
| SO 803 | Vegetační úpravy objektů místních a účelových komunikací | SM Opava | ASD ČR | 2 208 760 Kč | 2 208 760 Kč | |
| SO 804 | Oplocení pro zmíněné dopravní stavby na přírodně cenově lokálu v km 2,1 - 2,3 | SM Opava | ASD ČR | 620 800 Kč | 620 800 Kč | |
| Stavební objekty celkem bez DPH | | | | 1 098 937 710 Kč | 1 082 065 035 Kč | 16 872 675 Kč |
| Všeobecné položky a náklady | | | | 98 000 000 Kč | 98 000 000 Kč | |
| Celkem bez DPH | | | | 1 196 937 710 Kč | 1 180 065 035 Kč | 16 872 675 Kč |
| Rezerva 10% z celkových nákladů | | | | 119 693 771 Kč | 118 006 504 Kč | 1 687 268 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 1 316 631 481 Kč | 1 298 071 539 Kč | 18 559 943 Kč |



OPIS

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo dopravy
Ing. Antonín Prachar
ministr dopravy

Praha 7. srpna 2014

Č. j.: 205/2014-410-ROPO/1

Vážená paní,

s účinností od 1. srpna 2014 Vás pověřuji řízením státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Prslušné písemnosti budete podepisovat tak, že k Vašemu podpisu bude připojen dodatek
„pověřena řízením“.

Vaše platové podmínky v souvislosti s pověřením řízením Vám budou samostatně stanoveny.

S pozdravem

Vážená paní
Mgr. Bc. Soňa Krátková, Ph.D.

Ověření - legalizace

Právní ořad ořerovací knižky: 0-IV 142/2014
Ověřuji že: Mgr. Soňa Krátková, Ph.D.

Je pr. totožnost byla zjiřtlena z úředního průkazu, tuto listinu
před notářem vlastnoručníě podepsal a
V Praze dne 07.08.2014
Notář provádáním legalizace neodnovřda za obsah listiny

JUDr. Milena KRALOVA
notářka v Praze



Overení - včimace

Overuji, že tento opis složený ze 1 listu
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou ze 1 listu.

V Praze dne 7. 8. 2014



Milena Králová
Bc. Jolana Jiráňová
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Milenou Královou
notářkou v Praze

Kučel
